Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Dauer: 05.02.2006 - 20.10.2006 (Gesamtprojekt)	**Baustelle**	**Bauherr**	**Planerstellung:**
Jahr 1: 30.01.2006 - 04.02.2007 (dieses Blatt)	Neubau Helfer-Zentrum	Stadt Forchheim	Ingenieurbüro für Gesamtplanung
Datum: 17.07.2006 (Plan-Generierung)	THW OV Forchheim	Hauptstr. 24	Dieter Reck, Dipl.Ing. (FH), Baubiologe IBN
Plan-Nr:	Zur Staustufe 91301 Forchheim	91301 Forchheim	Kolpingsplatz 8 91301 Forchheim

Jahr 1 — **Angaben in Kalenderwochen**

Gewerke/Vergaben Gefährdungen/Einrichtungen Maßnahmen/Lösungen	Koordination	2006: Feb (5–8), Mrz (9–13), Apr (14–17), Mai (18–22), Jun (23–26), Jul (27–30), Aug (31–35), Sep (36–39), Okt (40–43), Nov (44–47), Dez (48–52) — 2007: Jan (1–4), 5	Zuständiges Unternehmen	Mitgeltende Unterlagen	Arbeitsschutzbestimmungen/ Hinweise
Baustellenvorbereitung					
Erdleitungen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Datenübertragung)					
Leitungen genau orten					BGV A 3, BGV A 1, EVU-, Stadtwerke-Vorschriften; D 152 (GM)
Leitungen sichern					BGV A 1, BGV A 3, EVU-, Stadtwerke-Vorschriften; D 152 (GM)
Lastentransport					
Baumaschinen als Hebezeug					ArbSchG, BetrSichV, BGR 500 Kap. 2.8
Baustelleneinrichtung					
Baustelleneinrichtung, allgemein					
Zusätzliche Vertragsbedingungen			Fösel		
Baustellensicherung					
Bauzaun			Fösel		MBO
Türen und Tore			Fösel		MBO
Erste Hilfe/Notfallvorsorge					
Alarmplan, Flucht- und Rettungsplan					MBO, BGV A 1, ArbStättV; A 2.1 (IM)
Erste Hilfe Kette, Ersthelfer, Verbandszeug			ALLE		BGV A 1, MBO, ArbStättV; A 2 (GM)
Kennzeichnung Flucht- und Rettungswege			Fösel		
Kommunikation					
Funktelefon			Alle		BGV A 1
Herstellen des elektrischen Baustellennetzes					
Potenzialausgleich schaffen			Fösel		BGI 594, BGI 608, BGV A 1, BGV A 3, VDE 0100, VDE 0105, Tl. 1
Strom - vom Netz			Fösel		
Baustellenverkehr und Lagereinrichtung					
BE-Plan mit Baustellenverkehrsplanung und Fahrordnung			Fösel		MBO
Ver- und Entsorgung von und mit Wasser					
Wasser - vom Netz			Fösel		BGV A 1, MBO
Entsorgung von Abfällen					
Entsorgungskonzept					KrW-/AbfG
Allgemeinbeleuchtung der Verkehrswege					
Beleuchtung in Gebäuden			Fösel		D 12.1 (IM); C 10 (GM), C 11 (GM)
Sozialeinrichtungen					
Sanitäranlagen			Fösel		ArbStättV, BGV A 1; A 6.1 (IM); A 173 (GM)
Brandschutz					
Handfeuerlöscher			Alle	Feuererlaubnisschein	BGR 133, BGV A 1, MBO; A 8 (IM); A 5 (GM)
Turmdrehkrane					
Standsicherheit			Fösel		BGV D 6, BetrSichV; B 59 (GM), B 58 (GM)
Rohbau / Stahl- u. Metallbauarbeiten					
Montage Fertigteile					
Absperrung			Renger		DIN 4420
Schriftliche Montageanweisung			Renger		C 12 (IM)
Standsicherheit Kraneinsatz			Renger		BGR 500 Kap. 2.8, BGV D 6
Schalungs-, Bewehrungs- und Betonierarbeiten					
Montageanweisung für Großflächenschalung			Fösel		BGR 182, BGV C 22, BGR 187, DIN 4421, DIN 1045; C 177 (GM)
Stellplan für Schalelemente			Fösel		BGV C 22
Taktpläne für Betonierarbeiten			Fösel		BGV C 22; C 11 (IM)
Traggerüst- und Lehrgerüstplan			Fösel		BGR 187, DIN 4421, BGV C 22, DIN 1045; C 122 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Bauobjekt					
Abdeckungen			Fösel, Renger		DIN 4420, BGV C 22; C 8 (GM)
Ausleger- und Konsolgerüst			Fösel, Renger		DIN 4420, BGV C 22; C 121 (GM)
Fahrgerüst			Renger		
Seitenschutz an Wandöffnungen			Renger		
Seitenschutz in Treppenhäusern			Fösel, Renger		BGV C 22, DIN 4420, ArbStättV; C 8 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst					
Planung der Arbeitsgerüste			Fösel, Renger		DIN 4420, BGV C 22, DIN EN 12811; C 45 (GM)
Seitenschutz			Fösel		BGV C 22; C 8 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang			Fösel, Renger		BGV C 22
Hochgelegene Arbeitsplätze: Schächte (vertikal)					
Seitenschutz, Umwehrungen			Alle		BGV D 36, DIN 4420; C 8 (GM)
Einsatz von Baumaschinen und Baugeräten					
Fahrordnung			Fösel, Renger		BetrSichV, BGV D 29, BGV D 6; A 96 (GM)
Reichweite			Fösel, Renger		BGV D 29, BGV D 6, BetrSichV, MBO
Standsicherheit			Fösel, Renger		BetrSichV, BGV D 29, BGV D 6; B 60 (GM), B 58 (GM)
Dachabdichtung / Dachdeckungsarbeiten					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Auffangnetz			Renger		BGV C 22, BGR 179; C 42 (GM)
Dachfanggerüst			Renger		DIN 4420, DIN EN 12811, BGR 203, BGR 179; C 156 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst					
Seitenschutz			Renger, Schmidt		DIN EN 12811, DIN 4420, BGV C 22; D 6 (IM); C 45 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang			Renger, Schmidt		BGV D 36, BGV C 22; D 6 (IM)
Umgang mit heißen Massen					
Betriebsanweisung			Renger, Schmidt		
Elektromontage / HLS-Montage					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Abdeckungen			Wolfschmidt, Käding		DIN 4420; D 7.1 (IM)
Fahrgerüste			Wolfschmidt, Käding		DIN 4422, BGV C 22, ArbStättV; C 23 (GM)
Seitenschutz an Wandöffnungen			Wolfschmidt, Käding		ArbStättV, DIN 4420; D 7.1 (IM)
Seitenschutz in Treppenhäusern			Wolfschmidt, Käding		ArbStättV, DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
Seitenschutz, Umwehrungen			Wolfschmidt, Käding		DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang			Wolfschmidt, Käding		DIN 4420, DIN EN 12811; D 6 (IM)
Hubarbeitsbühnen			Wolfschmidt, Käding		BGR 500 Kap. 2.10, DIN 4420, BGV C 22; B 50 (GM)
Seitenschutz, Umwehrungen			Wolfschmidt, Käding		BGR 500 Kap. 2.10, BGV C 22, DIN 4420, DIN EN 12811
Schweißen					
Betriebsanweisung			Wolfschmidt, Käding	Feuerbescheinigung	BGR 500 Kap. 2.26, BGI 608
Brand- und Explosionsschutz			Wolfschmidt, Käding	Feuerbescheinigung	BGV A 8, BGV D 34, BGR 500 Kap. 2.26; C 14 (IM), A 8 (IM); D 31 (GM)
Putzarbeiten / Trockenbau					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Abdeckungen			THW, Bischof		BGV C 22, DIN 4420, ArbStättV; D 7.1 (IM)
Fahrgerüste			THW, Bischof		DIN 4422, BGV C 22, ArbStättV; C 23 (GM)
Seitenschutz an Wandöffnungen			THW, Bischof		DIN 4420; D 7.1 (IM)
Seitenschutz in Treppenhäusern			THW, Bischof		DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
Seitenschutz, Umwehrungen			THW, Bischof		DIN 4420, ArbStättV, BGV C 22; C 8 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst					
Seitenschutz			THW, Bischof		DIN 4420, BGV C 22, DIN EN 12811; C 45 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang			THW, Bischof		BGV C 22, BGV D 36; D 6 (IM)
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Dämmmaterial - Mineralwolle					
Arbeitsmedizinische Untersuchung			Bischof		D 169 (GM)
Betriebsanweisung			Bischof		BGV A 4, BGV A 1; D 169 (GM)
Estricharbeiten / Bodenbelagsarbeiten					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Abdeckungen			Feulner+Streitner, THW		DIN 4420; D 7.1 (IM)
Seitenschutz an Wandöffnungen			Feulner+Streitner, THW		DIN 4420; D 7.1 (IM)
Seitenschutz in Treppenhäusern			Feulner+Streitner, THW		DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
Seitenschutz, Umwehrungen			Feulner+Streitner, THW		DIN 4420; D 7.1 (IM); C 8 (GM)
Malerarbeiten / Fenster- u. Rolltoreinbauten					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Abdeckungen			THW, Renger		BGV C 22, ArbStättV; D 7.1 (IM)
Fahrgerüste			THW, Renger		
Seitenschutz, Umwehrungen			THW, Renger		DIN 4420; C 8 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst					
Arbeitsgerüst (als Standgerüst)			THW, Renger		BGV C 22, DIN 4420, DIN EN 12811; C 45 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang			THW, Renger		BGV C 22
Hubarbeitsbühnen			THW		BGR 500 Kap. 2.10, BGV C 22; B 50 (GM)
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Umgang					
Belüftung			THW		BGV A 1, BGV A 4, BGV C 22; D 35
Betriebsanweisung			THW		BGV A 1, BGV A 4, BGV C 22; A 181 (GM)
Fliesenarbeiten					
Hochgelegene Arbeitsplätze und					
Abdeckungen			THW		DIN 4420, DIN EN 12811
Fahrgerüste			THW		DIN 4422, DIN 4420; D 6.3 (IM); C 23 (GM)
Gebäudereinigung					
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege: Bauobjekt					
Anseilschutz mit Anschlagpunkten					DIN EN 12811; C 43 (GM)
Fahrgerüste					BGV C 22, DIN 4422, ArbStättV; C 23 (GM)
Hochgelegene Arbeitsplätze: Arbeitsgerüst					
Arbeitsgerüst (als Standgerüst)					BGV C 22, DIN 4420, DIN EN 12811; C 45 (GM)
Beplanung der Gerüste					DIN EN 12811, DIN 4420, BGV C 22
Hochgelegene Arbeitsplätze: Zugänge					
Gerüste mit innenliegendem Leitergang					BGV D 36, BGV C 22
Hubarbeitsbühnen					BGR 500 Kap. 2.10; B 50 (GM)
Zusätzliche Baustellenvorbereitung: Umgang mit Gefahrstoffen					
Betriebsanweisung					BGV A 1, BGV A 4; A 181 (GM)
Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtu.					
Seitenschutz, Umwehrung					
Arbeitsgerüst (mit innenliegendem Leitergang)					
Abdeckung					
Fahrgerüst					
Seitenschutz an Wandöffnungen					
Seitenschutz in Treppenhäusern					
Hubarbeitsbühne					
Arbeitsgerüst (als Standgerüst)					

Zutritt für Unbefugte verboten!

Rauchen im Gebäude verboten!

Nicht unter gehobene Lasten treten!

Absturzgefahr, auf nicht gesicherten Belägen!


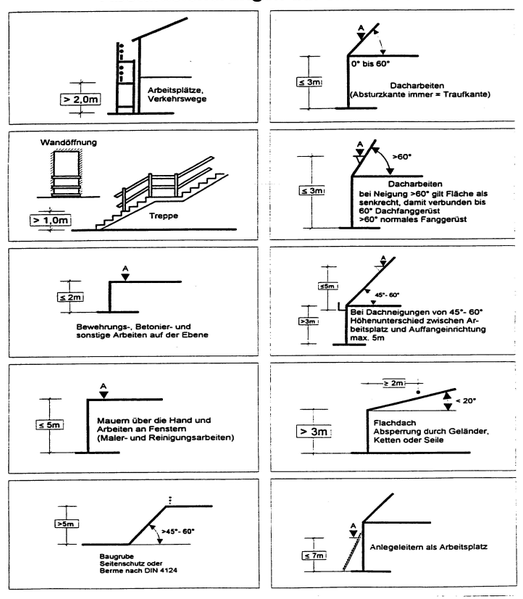
UVV „Bauarbeiten“, Ausgabe 4.93
– Absturzsicherungen auf einen Blick –
